

设计变更/补充通知单

建设单位:
CLIENT:


项目名称: 梧州市大坡初级中学1# 2#学生宿舍楼维修工程
PROJECT NAME:

项目编号:
PROJECT No.

有关图纸编号:
RELATIVE DRAWING No.

变更/补充原因及内容: 按业主要求作以下更改
MODIFICATION/SUPPLEMENT REASON& CONTENT:

1. 1#宿舍楼取消原有图纸内容: 取消割短32个m1021铁皮门工程量. 新增以下内容: 拆除原有宿舍1~4层旧外木门以及单间木门M1021 拆除后重新新增40个高级电解门
- 2、 1#宿舍楼原有图纸内容为: 1~4层每个宿舍户型内部 A#户型拆除原有7张铁架床, B#户型拆除原有10张铁架床, 装修完毕重新安装好. 现按业主要求将以上1~4层宿舍内部所有架床拆除后直接人工搬运下楼后当建筑废渣丢弃重新新增88张上下铺双层床板铁架床每张: 长200厘米、宽120厘米、高180厘米 为方管钢材厚度大于1.5MM 床板配备实木板厚度15MM
- 3.1#宿舍楼首层阳台设置8个304不锈钢防盗网厚度1.5MM 每个防盗网尺寸2米X3.6米
- 4.1#宿舍楼每个宿舍内部需拆除原有洗手盆4个塑料水龙头后重新安装4个新的PVC塑料水龙头

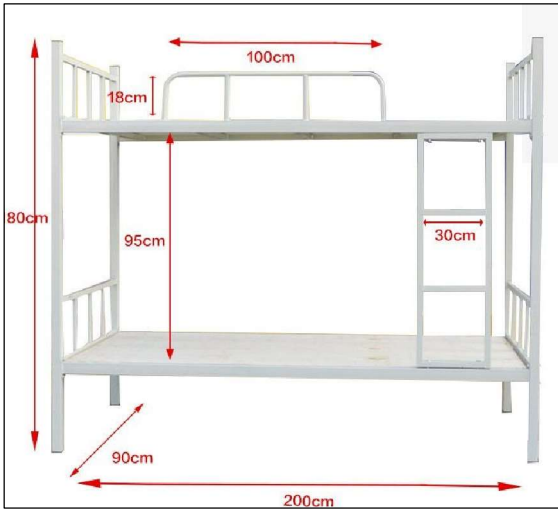

上下铺双层床板样式图

技术联系章
LZADCL TECH. SEAL



广西泽涛建筑设计有限公司
ZT DESIGN Co., LTD
建筑工程乙级设计证书 A245006950

项目负责人 PROJECT DIRECTOR	李一涛	专业 SPECIALTY	建筑
审定人 AUTHORIZED BY	陈建新	通知单编号 ADVICE NOTE No.	
制图人 DRAWING BY	黄暖荣	页数 PAGES	
